


ID	Nome attività	Durata
1	S.5.3 BIS - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA VIABILITA' ALTERNATIVA ALL'ITINERARIO S.5.3 BIS TRA PIEVE S. STEFANO E VERGHERETO	176 g
2	Apprestamento cantiere base	3 g
3	ESECUZIONE LAVORI	170 g
4	Apprestamento Cantiere intermedio fase A	1 g
5	FASE A - LAVORI TRA PROGR. 0+000 E 0+300	26 g
6	FASE A1 - LAVORI SULLA CORSIA DI SINISTRA	7 g
7	Chiusura della corsia di sinistra e regolamentazione del traffico a senso unico alternato sulla corsia di destra gestito da impianto semaforico	1 g
8	Scarifica dello strato bituminoso esistente e scavo per inserimento nuovo pacchetto stradale	1 g
9	Posa degli elementi di drenaggio di margine della strada	2 g
10	Posa del nuovo pacchetto stradale a meno dello strato di usura	3 g
11	FASE A2 - LAVORI SULLA CORSIA DI DESTRA	18 g
12	Chiusura della corsia di destra e regolamentazione del traffico a senso unico alternato sulla corsia di sinistra gestito da impianto semaforico	1 g
13	Scarifica dello strato bituminoso esistente e scavo per inserimento nuovo pacchetto stradale	1 g
14	Abbattonimento alberature interferenti	1 g
15	Posa degli elementi di drenaggio di margine della strada	2 g
16	Realizzazione pallificata e cordolo relativo	10 g
17	Posa del nuovo pacchetto stradale a meno dello strato di usura e realizzazione arginello per l'installazione delle barriere di sicurezza	3 g
18	FASE B - LAVORI TRA PROGR. 0+300 E 0+700	58 g
19	Apprestamento Cantiere intermedio fase B	1 g
20	FASE B1 - INTERRUZIONE COMPLETA DELLA STRADA	10 g
21	Scavo, demolizione del tombino esistente lato monte e realizzazione del manufatto di monte e posa del nuovo scacolatore prefabbricato al km 0+305, nella semicarreggiata	10 g
22	FASE B2 - LAVORI SULLA CORSIA DI SINISTRA	7 g
23	Chiusura della corsia di sinistra e regolamentazione del traffico a senso unico alternato sulla corsia di destra gestito da impianto semaforico	1 g
24	Scarifica dello strato bituminoso esistente e scavo per inserimento nuovo pacchetto stradale	1 g
25	Posa degli elementi di drenaggio di margine della strada	2 g
26	Posa del nuovo pacchetto stradale a meno dello strato di usura e realizzazione arginello per l'installazione delle barriere di sicurezza	3 g
27	FASE B3 - LAVORI SULLA CORSIA DI DESTRA	51 g
28	Chiusura della corsia di destra e regolamentazione del traffico a senso unico alternato sulla corsia di sinistra gestito da impianto semaforico	1 g
29	Scarifica dello strato bituminoso esistente e scavo per inserimento nuovo pacchetto stradale	2 g
30	Abbattonimento alberature interferenti	1 g
31	Realizzazione pallificata e cordolo relativo	35 g
32	Scavo, demolizione del tombino esistente lato valle e realizzazione del manufatto di valle e posa del nuovo scacolatore prefabbricato al km 0+305, nella semicarreggiata lato valle	8 g
33	Posa dello strato di collegamento (Blinder) del nuovo pacchetto stradale e realizzazione arginello per l'installazione delle barriere di sicurezza	4 g
34	FASE C - LAVORI TRA PROGR. 0+700 E 0+920	42 g
35	Apprestamento Cantiere intermedio fase C	1 g
36	FASE C1 - INTERRUZIONE COMPLETA DELLA STRADA DIREZIONE BALZE	7 g
37	Scavo, demolizione dei tombini circolari esistenti e realizzazione dei manufatti di monte e posa dei nuovi scotalari prefabbricati al km 0+778 e km 0+801, nella semicarreggiata	7 g
38	FASE C2 - LAVORI SULLA CORSIA DI SINISTRA	7 g
39	Chiusura della corsia di sinistra e regolamentazione del traffico a senso unico alternato sulla corsia di destra gestito da impianto semaforico	1 g
40	Scarifica dello strato bituminoso esistente e scavo per inserimento nuovo pacchetto stradale	1 g
41	Posa degli elementi di drenaggio di margine della strada	2 g
42	Posa dello strato di collegamento (Blinder) del nuovo pacchetto stradale	3 g
43	FASE C3 - LAVORI SULLA CORSIA DI DESTRA	28 g
44	Chiusura della corsia di destra e regolamentazione del traffico a senso unico alternato sulla corsia di sinistra gestito da impianto semaforico	1 g
45	Scarifica dello strato bituminoso esistente e scavo per inserimento nuovo pacchetto stradale	2 g
46	Abbattonimento alberature interferenti	1 g
47	Posa degli elementi di drenaggio di margine della strada	2 g
48	Realizzazione pallificata e cordolo relativo	8 g
49	Scavo, demolizione dei tombini circolari esistenti e realizzazione dei manufatti di valle e posa dei nuovi scotalari prefabbricati al km 0+778 e km 0+801, nella semicarreggiata	10 g
50	Posa dello strato di collegamento (Blinder) del nuovo pacchetto stradale e realizzazione arginello per l'installazione delle barriere di sicurezza	4 g
51	FASE D - LAVORI TRA PROGR. 0+920 E 1+185	9 g
52	Apprestamento Cantiere intermedio fase D	1 g
53	Chiusura completa della strada	1 g
54	Scarifica dello strato bituminoso esistente e scavo per inserimento nuovo pacchetto stradale	2 g
55	Posa degli elementi di drenaggio di margine della strada	2 g
56	Abbattonimento alberature interferenti	1 g
57	Posa del nuovo pacchetto stradale (no usura) e realizzazione arginello per l'installazione delle barriere di sicurezza	7 g
58	FASE E - LAVORI TRA PROGR. 0+920 E 1+185	7 g
59	Parzializzazione della carreggiata durante le lavorazioni finali	1 g
60	Stesa dello strato di usura	4 g
61	Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale	2 g
62	FASE F - LAVORI TRA PROGR. 0+700 E 0+920	9 g
63	FASE F1 - LAVORI SULLA CORSIA DI SINISTRA	4 g
64	Chiusura della corsia di sinistra e regolamentazione del traffico a senso unico alternato sulla corsia di destra gestito da impianto semaforico	1 g
65	Stesa dello strato di usura	2 g
66	Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale	1 g
67	FASE F2 - LAVORI SULLA CORSIA DI DESTRA	5 g
68	Chiusura della corsia di destra e regolamentazione del traffico a senso unico alternato sulla corsia di sinistra gestito da impianto semaforico	1 g
69	Stesa dello strato di usura	2 g
70	Installazione delle barriere bordo ponte	1 g
71	Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale	1 g
72	FASE G - LAVORI TRA PROGR. 0+300 E 0+700	10 g
73	FASE G1 - LAVORI SULLA CORSIA DI SINISTRA	4 g
74	Chiusura della corsia di sinistra e regolamentazione del traffico a senso unico alternato sulla corsia di destra gestito da impianto semaforico	1 g
75	Stesa dello strato di usura	2 g
76	Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale	1 g
77	FASE G2 - LAVORI SULLA CORSIA DI DESTRA	6 g
78	Chiusura della corsia di destra e regolamentazione del traffico a senso unico alternato sulla corsia di sinistra gestito da impianto semaforico	1 g
79	Stesa dello strato di usura	2 g
80	Installazione delle barriere bordo ponte	2 g
81	Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale	1 g
82	FASE H - LAVORI TRA PROGR. 0+000 E 0+300	9 g
83	FASE H1 - LAVORI SULLA CORSIA DI SINISTRA	4 g
84	Chiusura della corsia di sinistra e regolamentazione del traffico a senso unico alternato sulla corsia di destra gestito da impianto semaforico	1 g
85	Stesa dello strato di usura	2 g
86	Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale	1 g
87	FASE H2 - LAVORI SULLA CORSIA DI DESTRA	5 g
88	Chiusura della corsia di destra e regolamentazione del traffico a senso unico alternato sulla corsia di sinistra gestito da impianto semaforico	1 g
89	Stesa dello strato di usura	2 g
90	Installazione delle barriere bordo ponte	2 g




PROVINCIA DI AREZZO

SETTORE VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
 Servizio di Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR

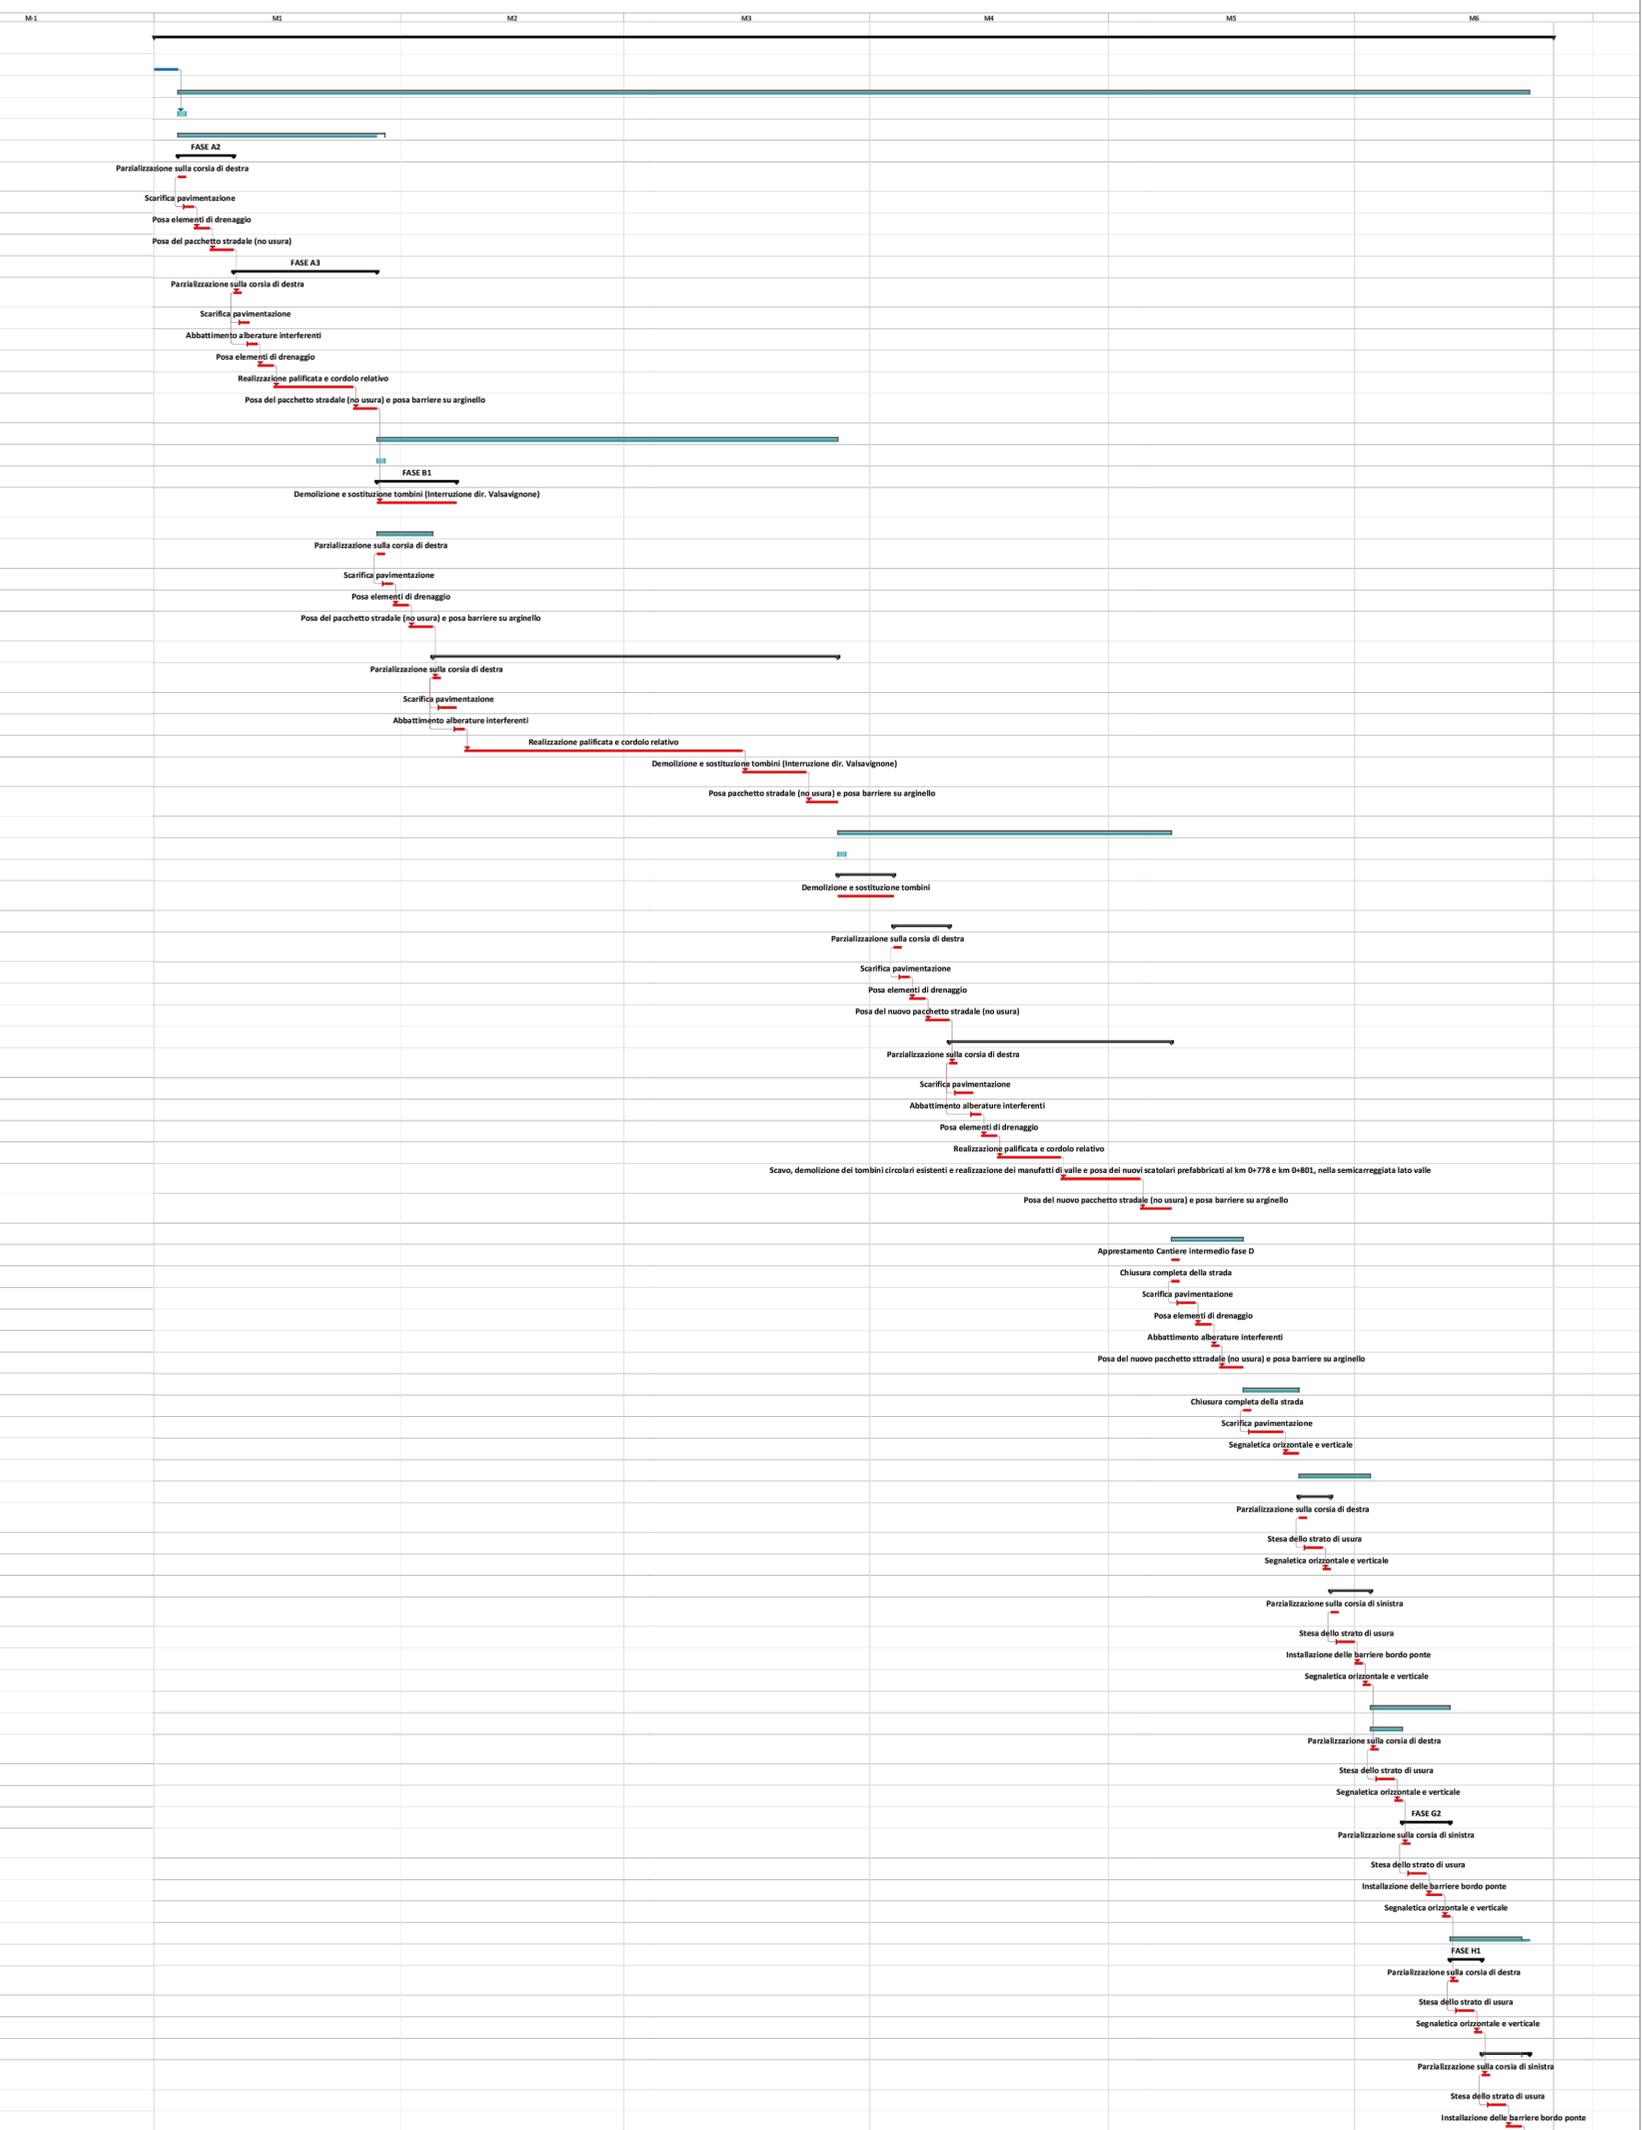

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA VIABILITA' ALTERNATIVA ALL'ITINERARIO S.S.3 BIS TRA PIEVE S. STEFANO NORD E CANILI
 lotto 1 stralcio 1 per l'esecuzione dei lavori sul tratto di 1,2 Km a nord di Valsavignone
 CUP I27H23000190001 CUI L80000610511202400013

PROGETTO ESECUTIVO
 STAZIONE APPALTANTE: **PROVINCIA DI AREZZO - Settore Viabilità e Lavori Pubblici**

PROGETTISTA E RESPONSABILE INTEGRATORE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
 Ing. D. BONADIES
 Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n° AB29

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:


GRUPPO DI PROGETTAZIONE
 Ing. M. RASIMELLI
 Ing. R. ALIUGI
 Ing. S. PELLEGRINI
 Ing. A. POLLI
 Ing. M. MARELLI
 Ing. A. LUCIA

PINI PINI SWISS ENGINEERS SA
 SWISS
 MANDANTE

IL GEOLOGO
 Dott. Geol. S. PIAZZOLI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
 Ing. L. IOVINE

PINI PINI SWISS ENGINEERS Srl
 ITALIA
 MANDANTE

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
 Ing. P. BRACCIALI

PROTOCOLLO _____ DATA: _____

SICUREZZA CRONOPROGRAMMA				
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)	T00_S100_SIC_CR01_B	REVISIONE		
PROGETTO	LV. PROG. N. PROG.			
- - - - -	- - - - -	CODICE ELAB.	T00S100SICR01	B
D				
C				
B	REVISIONE A SEGUITO DI ISTRUTTORIA	DIC 2024	PONZO	ARCELLI BONADIES
A	PRIMA EMISSIONE	GIUGNO 2024	PONZO	ARCELLI BONADIES
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO
