
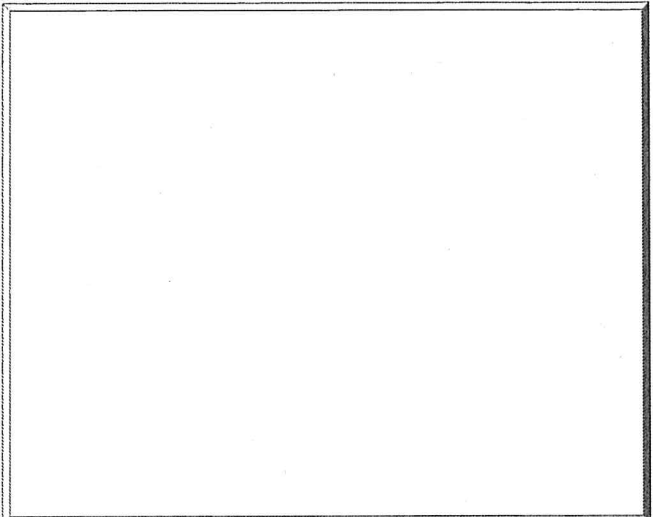


ALL 1)

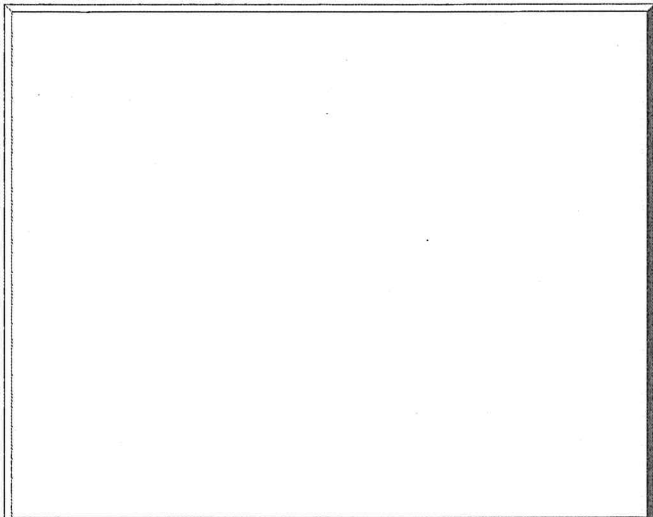

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

OGGETTO

MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 2 DEL
DLGS 50/2016: RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SULL'ALLACCIANTE
DI SINISTRA LUNGO LA S.P.27 DI CASTRONCELLO-BROLIO NEL
COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

CATEGORIA PROGETTO

PROGETTO STRUTTURALE

CONTENUTO TAVOLA

RELAZIONE GENERALE

ALLEGATO

A03

ARCHIVIO

ST-17-028

COMMITTENTE

Provincia di Arezzo

PROPRIETARIO

Provincia di Arezzo

DATA

07/06/2019

STATO

-

UNITA' DI MISURA

-

SCALA

-


REVISIONI

-	-
-	-

ELABORATO N°

MODIFICA CONTRATTUALE N. 2

—



STUDIO TECNICO CAPPELLETTI


Via Adua. 60 - 52043 Castiglion Fiorentino
tel 0575/657108 - fax 0575/1710180
e-mail: info@cappellettiassociati.it
www.cappellettiassociati.it

IL PROGETTISTA

Ing. Nicola Cappelletti


IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Nicola Cappelletti




Indice

1 INTRODUZIONE.....	3
2 DESCRIZIONE GENERALE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL DLGS 50/2016.....	4
2.1 Motivazioni della modifica contrattuale ai sensi dell'Art.106, comma 2 del Dlgs 50/2016.....	4
2.2 Descrizione delle modifiche apportate in modifica contrattuale ai sensi dell'Art.106, comma 2 del Dlgs 50/2016.....	4
2.3 Variazione degli importi di contratto in seguito alla modifica contrattuale ai sensi dell'Art.106, comma 2 del Dlgs 50/2016.....	5



1 INTRODUZIONE

Il sottoscritto **Ing. Nicola Cappelletti** nella qualità di progettista delle strutture e direttore dei lavori redige il presente documento a seguito di variate esigenze in relazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'Art.106, comma 2 del Dlgs 50/2016 al progetto **“Ristrutturazione del ponte sull'allacciamento di sinistra lungo la S.P.27 di Castroncello-Brolio nel Comune di Foiano della Chiana (AR).”**



2 DESCRIZIONE GENERALE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL DLGS 50/2016

2.1 Motivazioni della modifica contrattuale ai sensi dell'Art.106, comma 2 del Dlgs 50/2016


Il giorno 27 maggio 2019 è stato riaperto il traffico veicolare sul ponte sul canale Maestro della Chiana lungo la S.P. 27 di Castroncello-Brolio nel Comune di Foiano della Chiana con apposito verbale di riapertura al transito veicolare; nel suddetto documento si sottolineava che rimanevano da realizzarsi opere secondarie di finitura che non influivano in alcun modo sulla sicurezza della struttura stessa.

Al fine della riapertura del ponte, tutte le impalcature ed i dispositivi di sicurezza connessi sono stati smontati e per l'effettuazione delle lavorazioni finali sopra descritte si è reso necessario il noleggio e l'utilizzo di ulteriori mezzi indispensabili per la realizzazione delle opere finali in sicurezza per tutta la durata del cantiere.

2.2 Descrizione delle modifiche apportate in modifica contrattuale ai sensi dell'Art.106, comma 2 del Dlgs 50/2016

Gli elementi che comportano la modifica contrattuale ai sensi dell'Art.106, comma 2 del Dlgs 50/2016 sono i seguenti:

- noleggio di piattaforma autocarrata articolata o telescopica necessaria per la realizzazione delle finiture



2.3 Variazione degli importi di contratto in seguito alla modifica contrattuale ai sensi dell'Art.106, comma 2 del Dlgs 50/2016

In precedenza, in corso d'opera si era riscontrata la necessità di eseguire piccole modifiche in fase esecutiva che hanno variato l'importo di contratto per una cifra inferiore al 15% nel rispetto dell'art. 106 comma 2 del D.lgs 50-2016 (Nuovo Codice Appalti) approvata con Decreto Dirigenziale n.614 del 05/06/2019.

Con la presente modifica contrattuale ai sensi dell'Art.106, comma 2 del Dlgs 50/2016 si è ulteriormente variato l'importo di contratto; la somma delle variazioni dell'importo di contratto comporta una modifica dell'entità del contratto originale inferiore al 15% come da Normativa.

PROVINCIA DI AREZZO

MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 2 DEL DLGS 50/2016:
RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SULL'ALLACCIANTE DI SINISTRA LUNGO LA S.P. 27 DI
CASTRONCELLO-BROLIO NEL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA


IMPORTO PER LAVORI, FORNITURE, SERVIZI		unitario	TOTALE
	Importo dei lavori contratto	€ 221.161,16	
	Importo dei lavori totale in seguito alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Dlgs 50/2016	€ 243.272,04	
	Importo dei lavori consistenti la modifica contrattuale	€ 22.110,88	
	importo dei lavori a misura totale in seguito alla modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 2 del Dlgs 50/2016	€ 243.272,04	
	Totale importo dei lavori		€ 243.272,04
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso come da contratto originario non modificati	€ 21.483,82	
	Oneri per la sicurezza consistenti la modifica contrattuale	€ 7.420,45	
	Importo oneri della sicurezza in seguito alla modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 2 del Dlgs 50/2016	€ 28.904,27	
	Totale oneri per la sicurezza		€ 28.904,27
Totale importo dei lavori e delle forniture e degli oneri della sicurezza da contratto originario			€ 242.644,980
Totale importo dei lavori da contratto originario soggetto a ribasso			€ 221.161,160
Totale importo dei lavori e delle forniture e della sicurezza da contratto originario al netto del ribasso (15,85%)			€ 207.590,936

STUDIO TECNICO CAPPELLETTI**Professionisti Associati**

Arch. Giulio Cappelletti – Arch. Lorenzo Cappelletti – Ing. Nicola Cappelletti

Via Adua, 60 - 52043 Castiglion Fiorentino (AR)

Tel: 0575-657108 – Fax: 0575-1710180 – email: info@cappellettiassociati.it



<i>Totale importo dei lavori e delle forniture e degli oneri della sicurezza in seguito alla modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 2 del Dlgs 50/2016</i>	€ 272.176,310
<i>Totale importo dei lavori in seguito alla modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 2 del Dlgs 50/2016 soggetto a ribasso</i>	€ 243.272,040
<i>Totale importo dei lavori e delle forniture e della sicurezza in seguito alla modifica contrattuale ai sensi dell'art.106 comma 2 del Dlgs 50/2016 al netto del ribasso (15,85%)</i>	€ 233.617,692
<i>Variazione massima dell'importo contrattuale ammessa dall'art.106 comma 2 del Dlgs 50/2016 al netto del ribasso (15,85%)</i>	€ 31.138,640
<i>Totale modifica contrattuale dell'appalto in oggetto al netto del ribasso (15,85%)</i>	€ 26.026,756
<i>Totale modifica contrattuale dell'appalto in oggetto al netto del ribasso in confronto al contratto originario (%)</i>	12,54%
